
SCOUT
HOUSE

Схема
установки гильз
в панели пола

Если в чертеже нет особых указаний, то по умолчанию гильзы устанавливаются следующим образом:

1. Гильзы из ПП канализационных труб устанавливаются в панель до упора бортиком под уплотнительное кольцо-манжету. Низ гильзы должен совпадать с ветрозащитой.

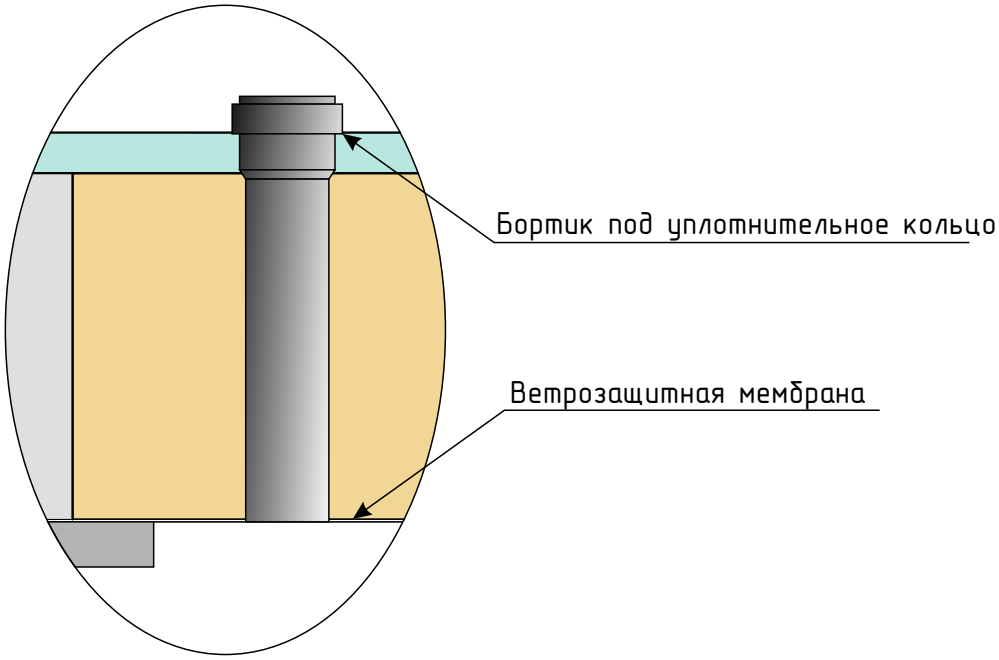

Для крепления гильз можно установить распорку между лаг и притянуть к ней гильзу перфолентой. Перфоленту закрепить саморезами к распорке.


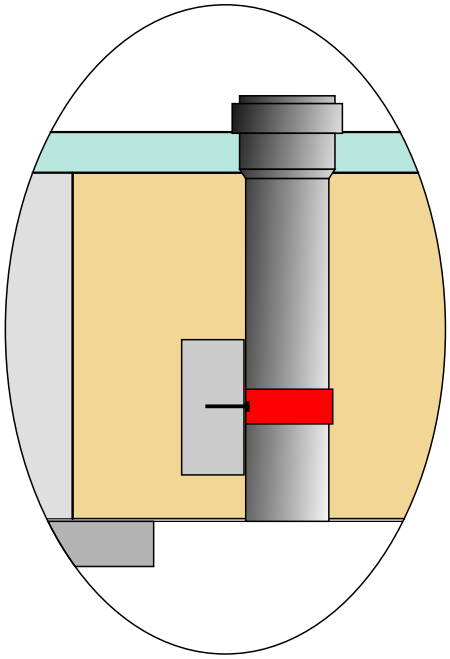




Схема установки гильз в панели пола

Если в чертеже нет особых указаний, то по умолчанию гильзы устанавливаются следующим образом:

2. Гильзы из прямоугольных вентканалов устанавливаются с выпуском 30мм за пределы фанеры. Низ гильзы должен совпадать с ветрозащитой.

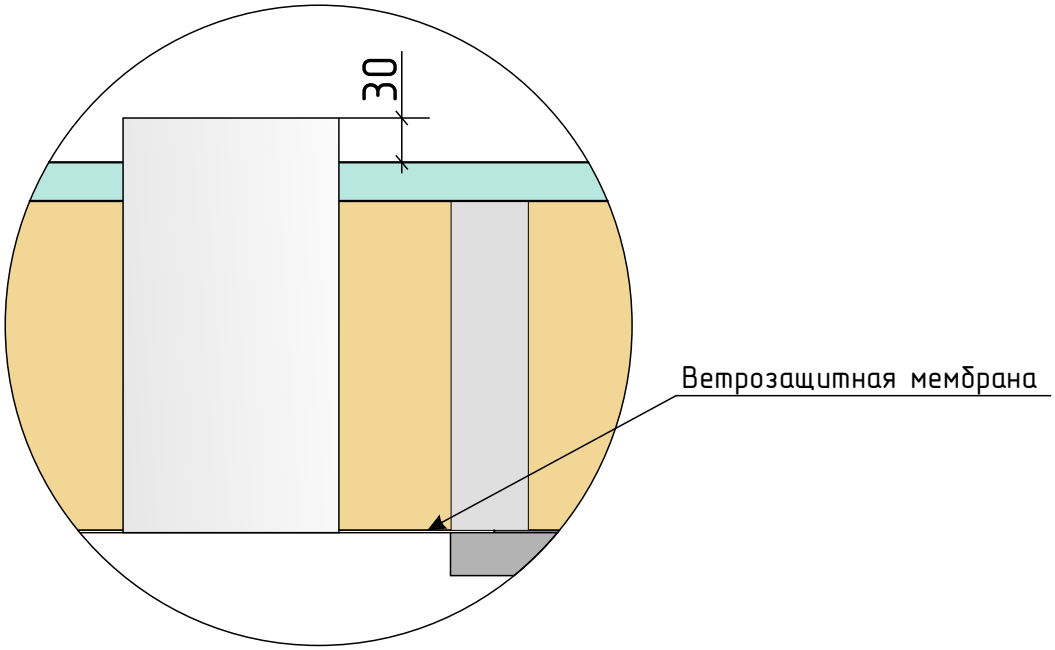

Для крепления гильз можно установить распорки между лаг и закрепить к ним гильзу саморезами.


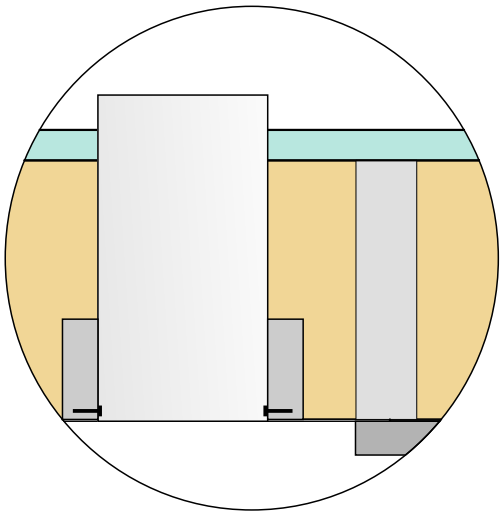




Схема установки гильз в панели пола

Если в чертеже нет особых указаний, то по умолчанию гильзы устанавливаются следующим образом:

3. Гильзы для кондиционера устанавливаются заподлицо с фанеролй. Низ гильзы должен совпадать с ветрозащитой.

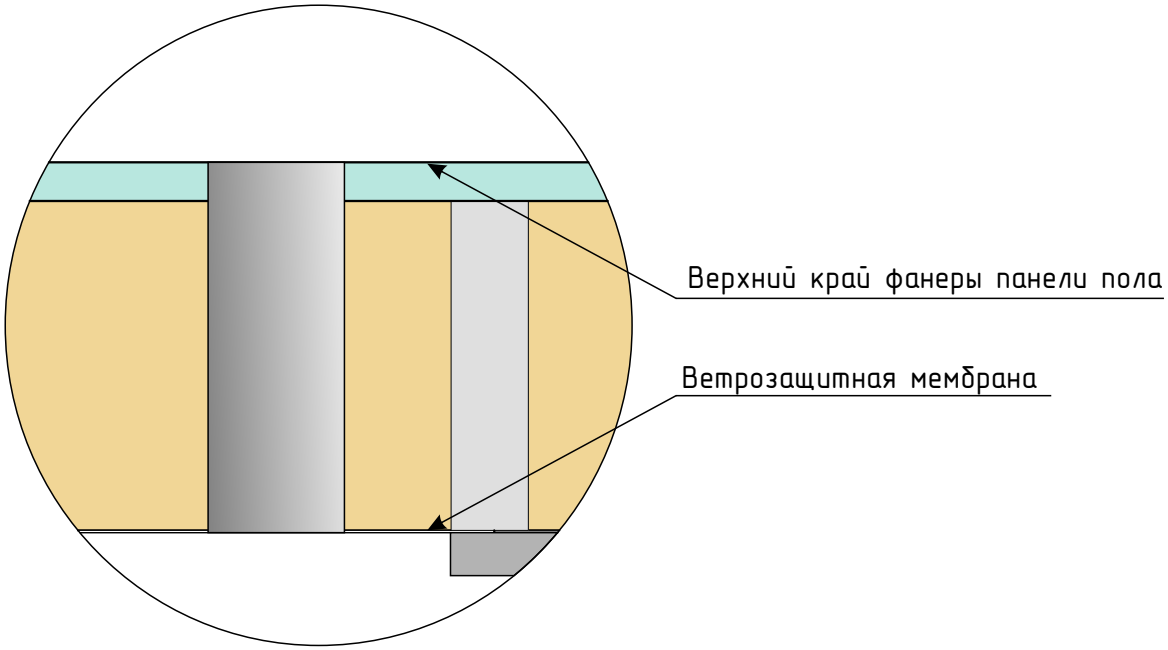

Для крепления гильз можно установить распорку между лаг и притянуть к ней гильзу перфолентой. Перфоленту закрепить саморезами к распорке.

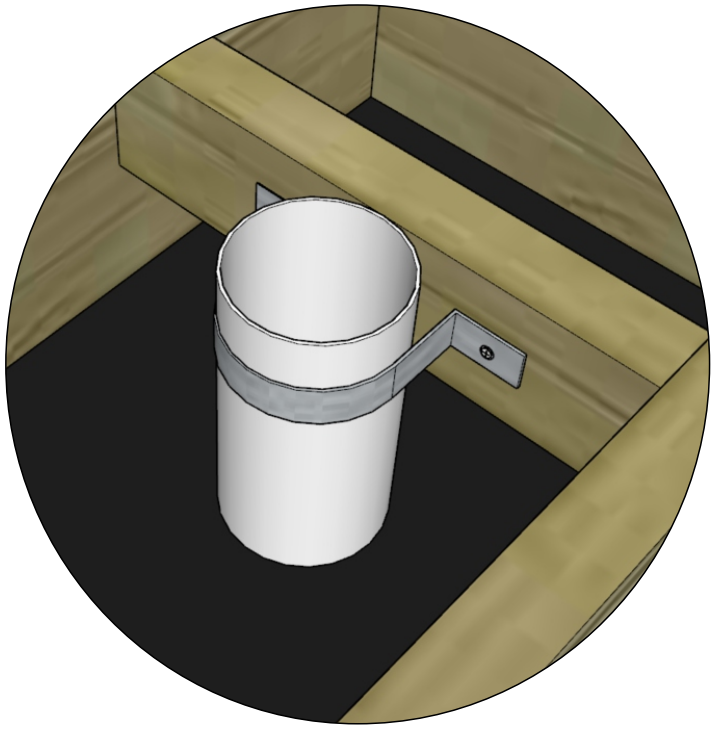


Схема установки гильз в панели пола

Лист 5
