
СКАУТ
ХАУС

Схема
установки трапа
Анипласт

Схема установки трапа (сифон TQ5612 АниПласт) в панели пола.

Работы, выполняемые на стадии изготовления панели пола.

1. На листе Раздела ИР «Канализация» даны размеры установки трапа.

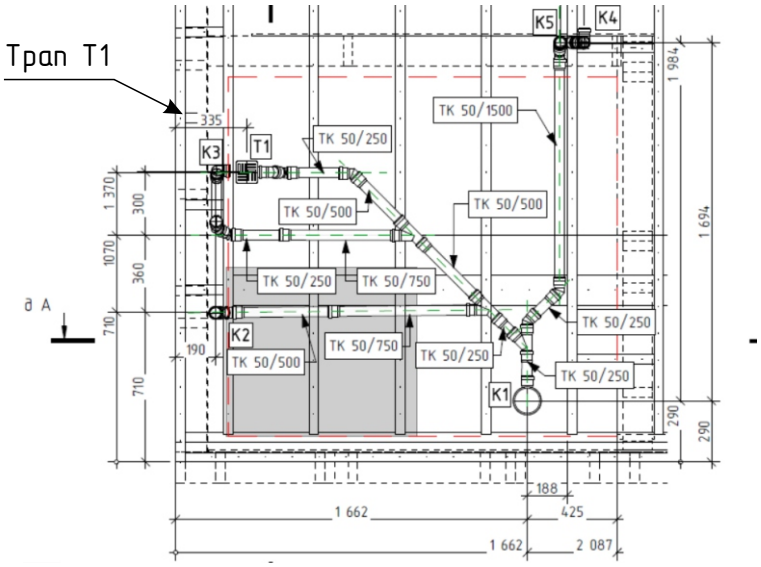

2. По проектным размерам сделать отверстие коронкой диаметром 114мм под корпус сифона. С лицевой стороны панели пола сифон закрепить при помощи фанеры, чтобы собрать трассу канализации и нанести ППУ утеплитель.





